Plano de Sinalização Temporária

	PST	Data:	09-07-2020
	Dono da Obra: Câmara Municipal de Arganil		
	Obra: REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - GRUPO V		
	Empreiteiro: Socitop Lda		

MEMÓRIA DESCRITIVA

INTRODUÇÃO

O presente Plano de Sinalização Temporária (PST) é referente à empreitada de "Reabilitação de Vias Municipais- Grupo V".

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

A empreitada comtempla a pavimentação e sinalização da Rua do Outeiro, Rua da Gandara e Estrada do Campo de Futebol, em Coja no Município de Arganil.
Encontram-se diversas atividades principais, nomeadamente:

- Limpeza de bermas e pavimento
- Drenagem
- Pavimentação em misturas betuminosas a quente
- Sinalização horizontal

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHOS

Tendo em conta a área de intervenção, a circulação será interdita ou condicionada de acordo com os trabalhos a executar, garantindo que todos os trabalhos possam ser executados sempre com as condições de segurança.

A circulação condicionada representa uma alteração ao normal desenvolvimento do tráfego rodoviário, pelo que para o efeito será implementada a sinalização temporária apresentada para alertar e informar os utentes que nesses troços decorrem obras.

Assim, apresenta-se o respetivo esquemas de sinalização temporária a adotar onde está devidamente identificada a sinalização temporária a implementar nas extremidades dos locais onde é materializada a circulação interdita/condicionada.

A sinalização temporária identificada nos esquemas deverá ser mantida durante a execução dos trabalhos e removida aquando da sua conclusão.

A alteração ao normal desenvolvimento do tráfego rodoviário terá a duração necessária à execução dos trabalhos, mediante a decorrência normal dos trabalhos, condições atmosféricas a verificar e/ou imprevistos na realização dos trabalhos.

O esquema pretendem ser um guia para a implementação da sinalização temporária dos trabalhos, no entanto, e em função das condições no terreno, estas indicações podem ser alteradas/ajustadas desde que sejam asseguradas as condições de segurança dos utentes, trabalhadores e equipamentos, mantendo a coerência e fácil leitura da sinalética.

ANEXOS

Localizações das principais intervenções

Troço a intervir com trabalhos-interdito ou condicionado parcialmente

Rua da Gandara:

Rua do Outeiro:

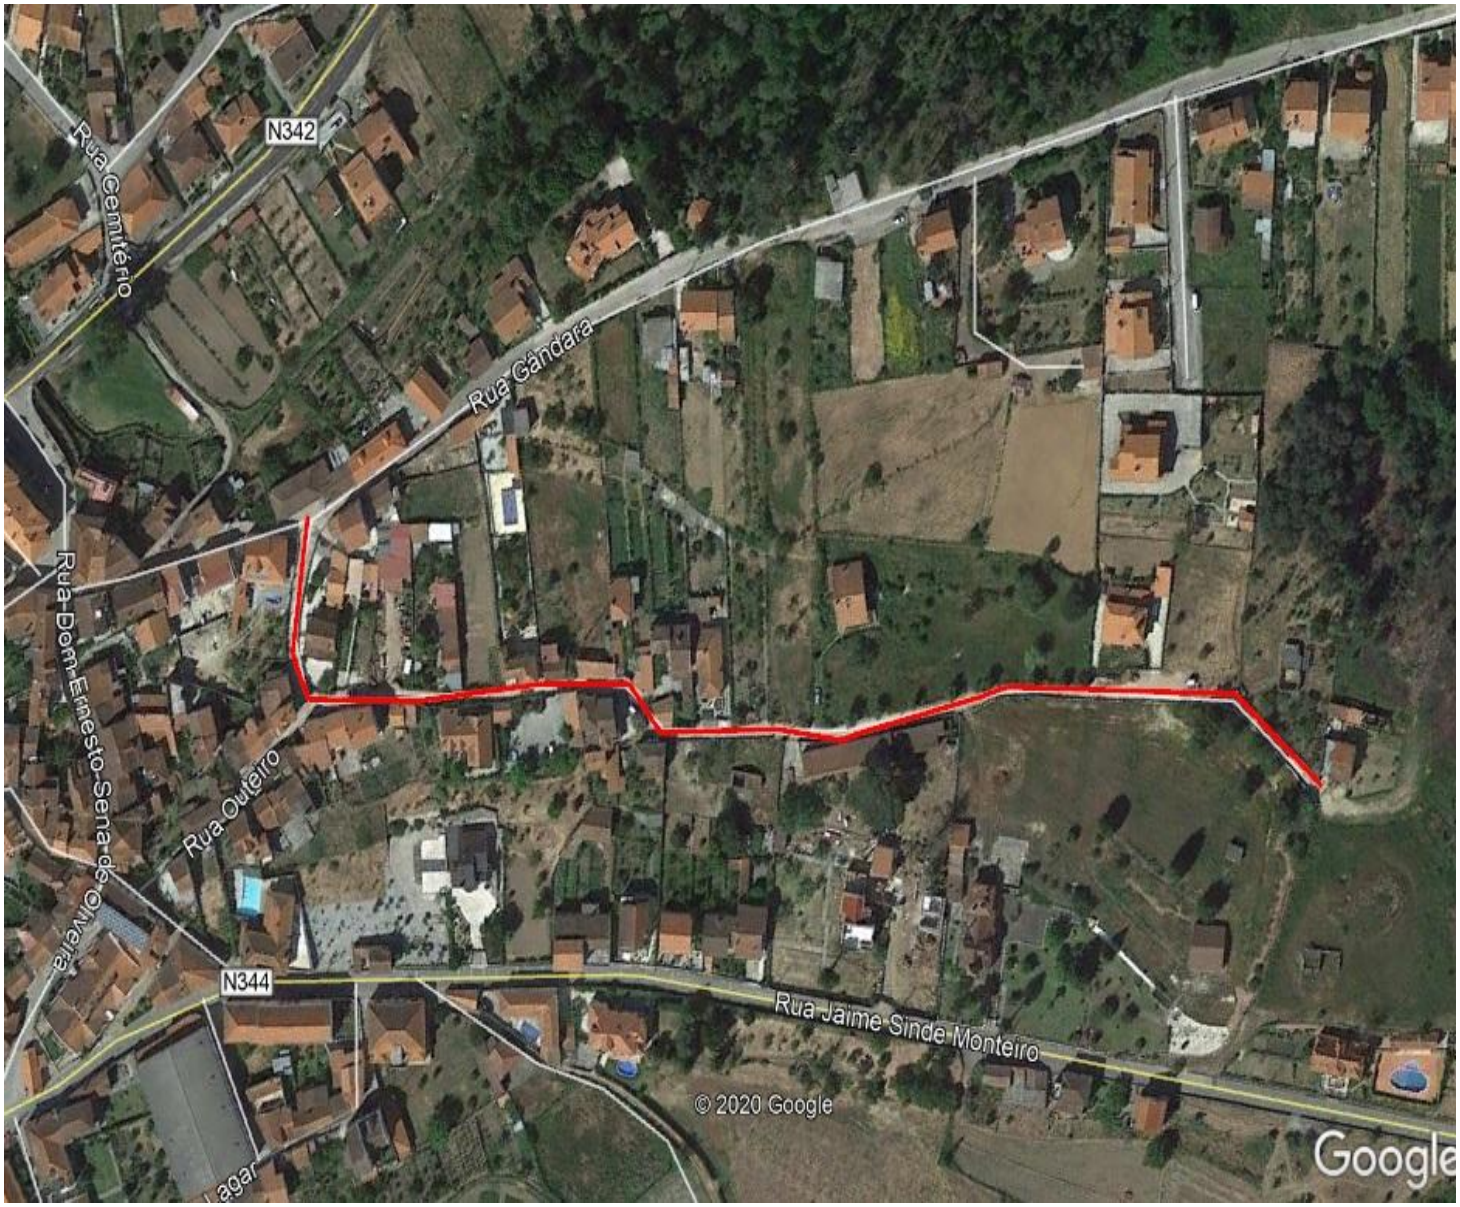

Estrada do Campo de Futebol (Rua da Carriça):

ESQUEMAS DE SINALIZAÇÃO

Troço a intervir com trabalhos

Rua da Gândara:

Tempo previsto: 8 semanas
Inicio: 15/07/2020

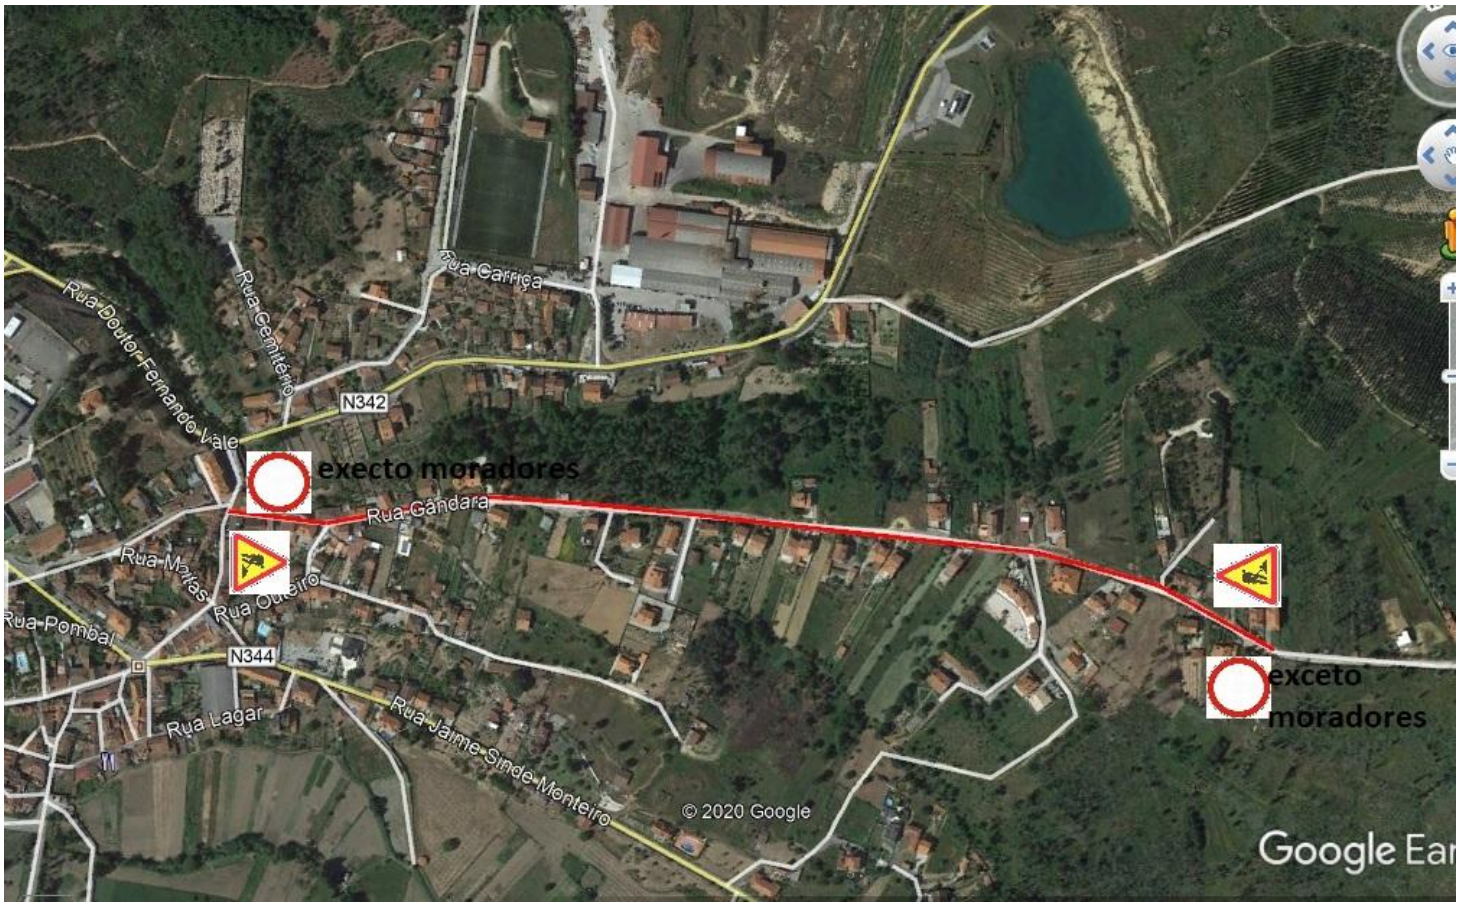

Esta sinalização será instalada para execução da drenagem enterrada e pavimentação com corte de trânsito total até á frente de trabalho.
Serão criadas as condições de acesso pedonal aos moradores, sendo que os veículos terão acesso restrito de acordo com o espaço disponível.
A junta de freguesia deverá informar a população através de editais ou outros meios eficientes.

Rua do Outeiro:

Tempo previsto: 2 semanas

Inicio: em função das obras de alargamento previstas

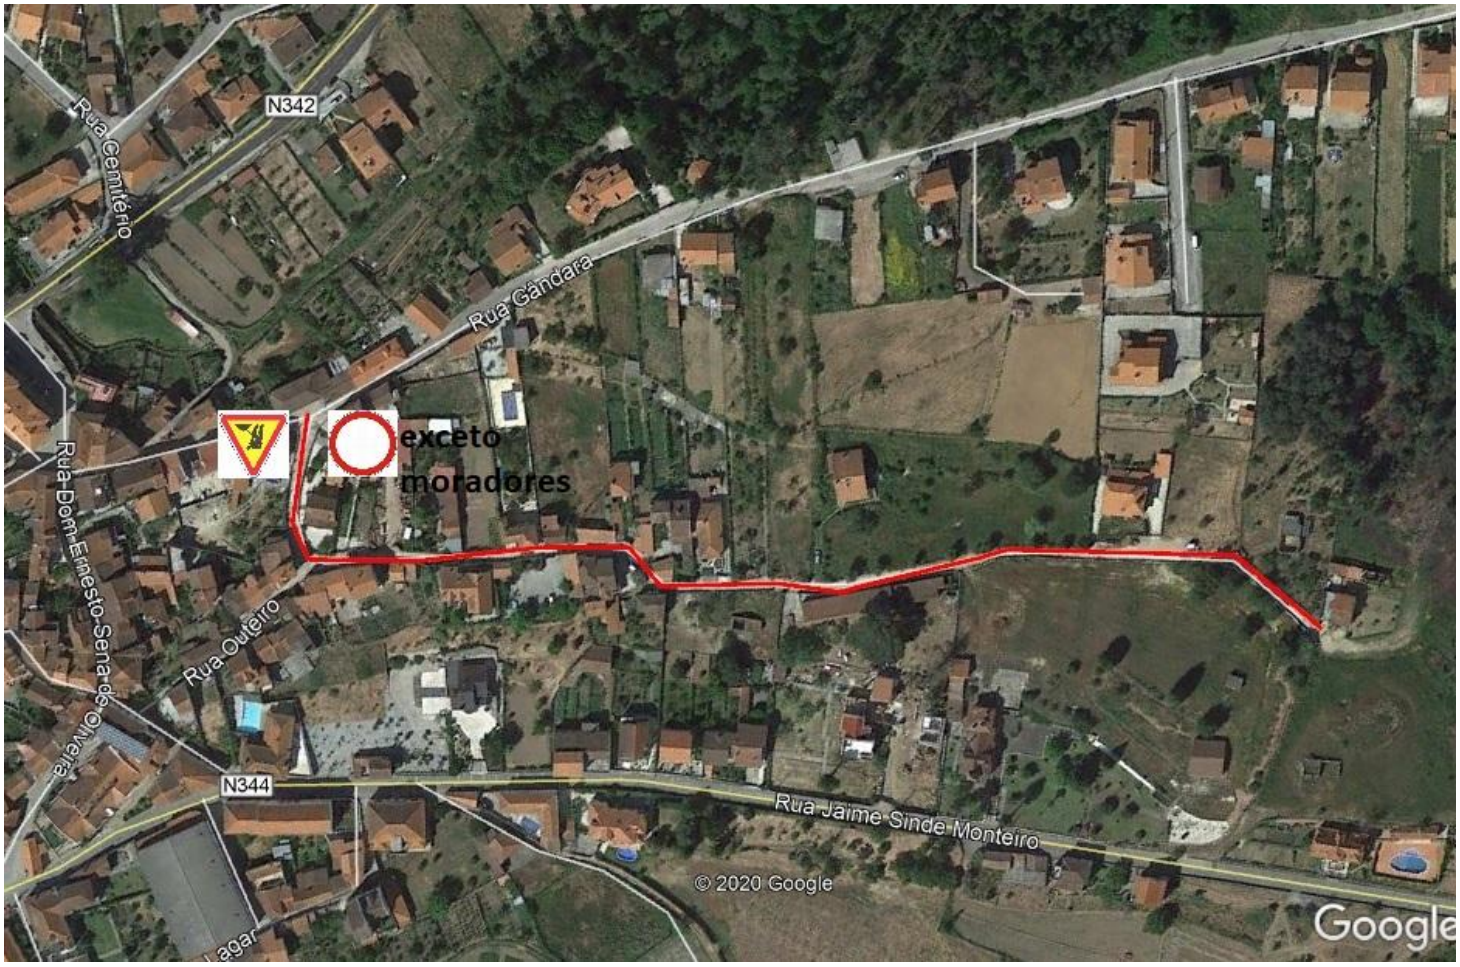

Esta sinalização será instalada para execução da pavimentação com corte de trânsito total até á frente de trabalho.

Serão criadas as condições de acesso pedonal aos moradores, sendo que os veículos terão acesso restrito de acordo com o espaço disponível.

A junta de freguesia deverá informar a população através de editais ou outros meios eficientes.

Estrada do Campo de Futebol (Rua da Carriça):

Tempo previsto: 6 semanas

Inicio: 27/07/2020

Esta sinalização será instalada para execução da drenagem e pavimentação com trânsito condicionado nas frentes de trabalho.

Serão criadas as condições de acesso pedonal aos moradores, sendo que os veículos terão acesso restrito de acordo com o espaço disponível.

A junta de freguesia deverá informar a população através de editais ou outros meios eficientes.
